
Custo Plano
CONSULTORIA

PLANEJAMENTO, CONTROLE E QUALIDADE DE OBRAS

Sua obra no prazo, no custo e com qualidade, **controlada toda semana** a partir do seu cronograma.

PRAZO · CUSTO · QUALIDADE

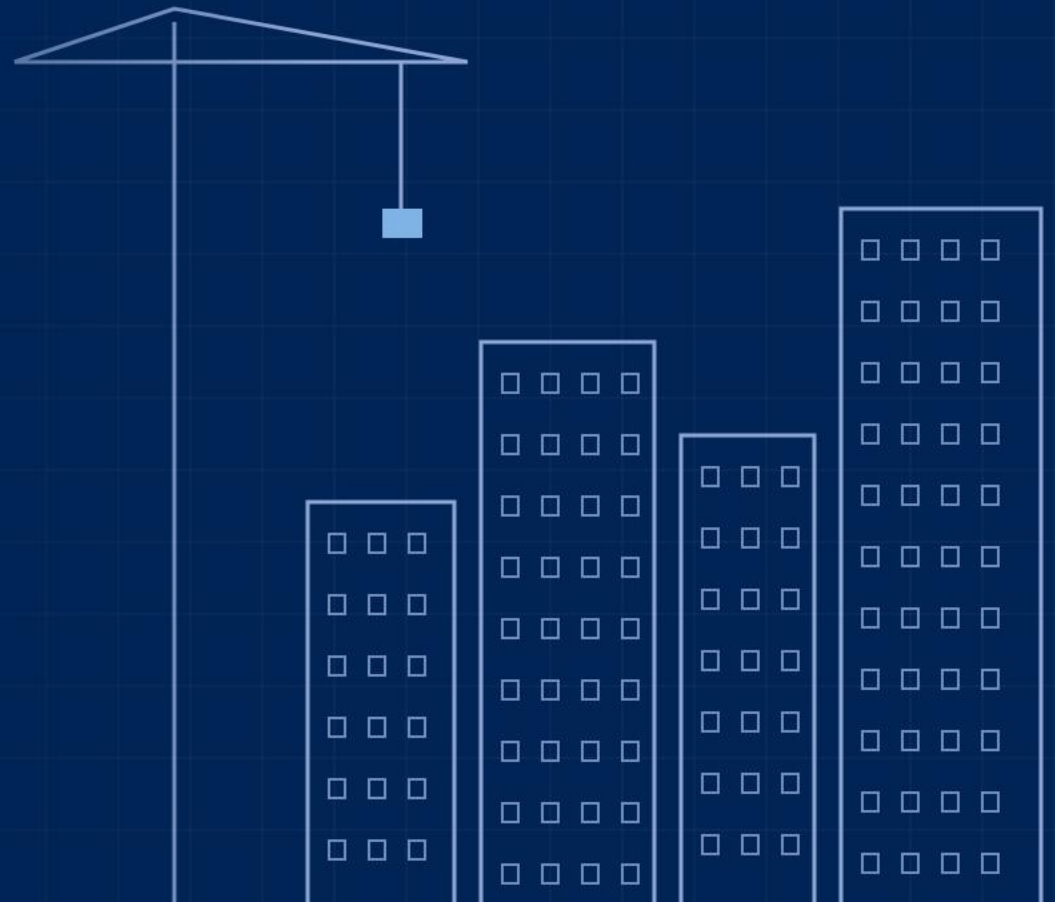

Apresentação institucional · 2026 · custoplano.com.br

O PROBLEMA

Por que as obras **saem do planejado**

Toda obra começa com um orçamento e um cronograma. Quase toda obra termina diferente deles. A distância não vem de azar:

PRAZO

Plano que ninguém consulta

O cronograma é feito para aprovar a obra e fica na gaveta. O canteiro decide o dia a dia sem ele.

CUSTO

Medição que chega tarde

O avanço é medido no fim do mês, quando já não dá tempo de corrigir o atraso nem o custo.

QUALIDADE

Retrabalho sem controle

Serviço sem verificação volta para ser refeito e consome prazo e margem.

O QUE FAZEMOS

O que a Custo Plano **faz**

ANTES DA OBRA OU QUANDO ELA SAIU DO TRILHO

Planejamento

- estudo de prazo e estratégia de ataque
- cronograma com linha de base
- linha de balanço por pavimento
- histograma de mão de obra e suprimentos
- orçamento meta e curva de desembolso

UMA REUNIÃO CURTA TODA SEMANA, COM NÚMEROS

Controle semanal

- curto prazo e PPC
- levantamento e remoção de restrições
- medição física e curva S
- custo previsto × realizado
- relatório mensal para a diretoria

PBQP-H E ISO 9001 QUE O CANTEIRO CUMPRE

Qualidade

- procedimentos e fichas FVS/FVM
- verificações (FVS) e não conformidades, com a equipe da obra
- preparação para auditoria
- treinamento de mestres e encarregados

IMPLANTAÇÃO

Como implantamos **na sua obra**

1

Diagnóstico

Visita e leitura de projetos, orçamento e contratos, para ver o que já funciona e o que trava a produção.

ENTREGA: RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO

2

Plano de longo prazo

Organizamos o cronograma da sua engenharia, com etapas, sequência e ritmo por pavimento definidos por ela.

ENTREGA: CRONOGRAMA E LINHA DE BALANÇO

3

Implantação no canteiro

Reuniões semanais com o engenheiro e os encarregados da obra, painel de restrições e apontamento.

ENTREGA: ROTINA SEMANAL E PPC

4

Controle contínuo

Prazo, custo e qualidade acompanhados, com replanejamento quando a obra desvia.

ENTREGA: RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

ROTINA

Uma semana de obra **com a Custo Plano**

Segunda	Reunião de curto prazo com o engenheiro e os encarregados. Fecha o PPC da semana anterior, anota por que cada pacote não saiu e define os desta semana.
Terça a quinta	Restrições de material, projeto, equipe e frente liberada, cada uma com responsável e data.
Sexta	Medição pelo celular, pavimento por pavimento, e FVS nos serviços que terminaram. O que for reprovado vira não conformidade com prazo.
Fim do mês	Relatório para a diretoria com avanço contra a linha de base, IDP, IC e não conformidades em aberto.

SISTEMA

Sistema próprio, **incluído na consultoria**

Ligado ao MS Project

Lê o .mpp da obra e devolve o arquivo atualizado.

Medição no celular

Funciona sem internet e envia quando o sinal volta.

Qualidade no canteiro

FVS com foto e não conformidades com prazo.

Custo, orçado × realizado

Dados do ERP mês a mês e estimativa no término (IC).




COMO FUNCIONA

Do cronograma ao canteiro, **e de volta**

1 Importa o cronograma (.mpp) com EAP, datas, linha de base e pesos.

2 Mede no celular, tarefa por tarefa.

3 Devolve o arquivo ao Project e gera o relatório.

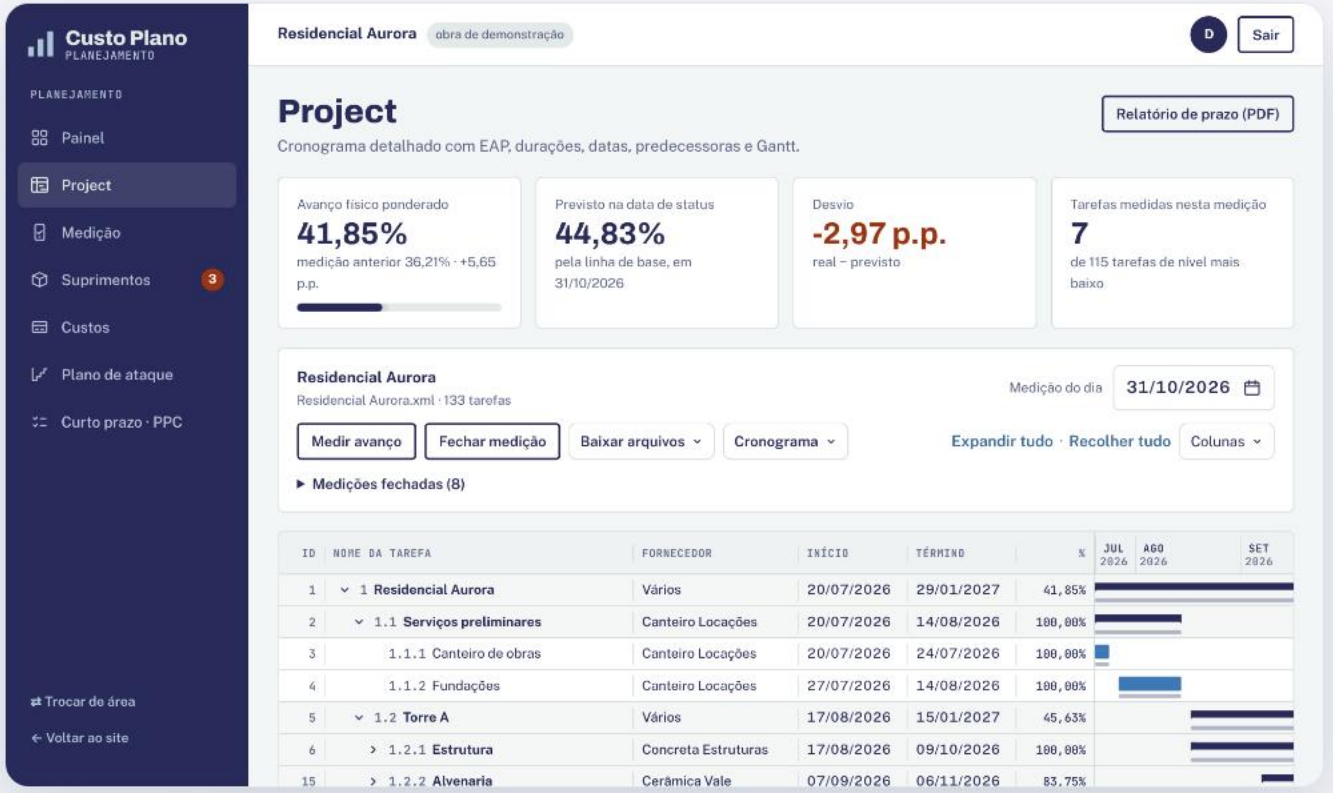

Tela do sistema · obra fictícia Residencial Aurora


PLANO DE ATAQUE

Plano de ataque e **linha de balanço**

A escadinha que a obra já usa no Excel entra direto, sem redigitar.

Cada célula é a data de um serviço num pavimento: verde executado, vermelho atrasado, cor do mês para o programado.

A comparação com a linha de base mostra quantos dias cada pacote ganhou ou perdeu.

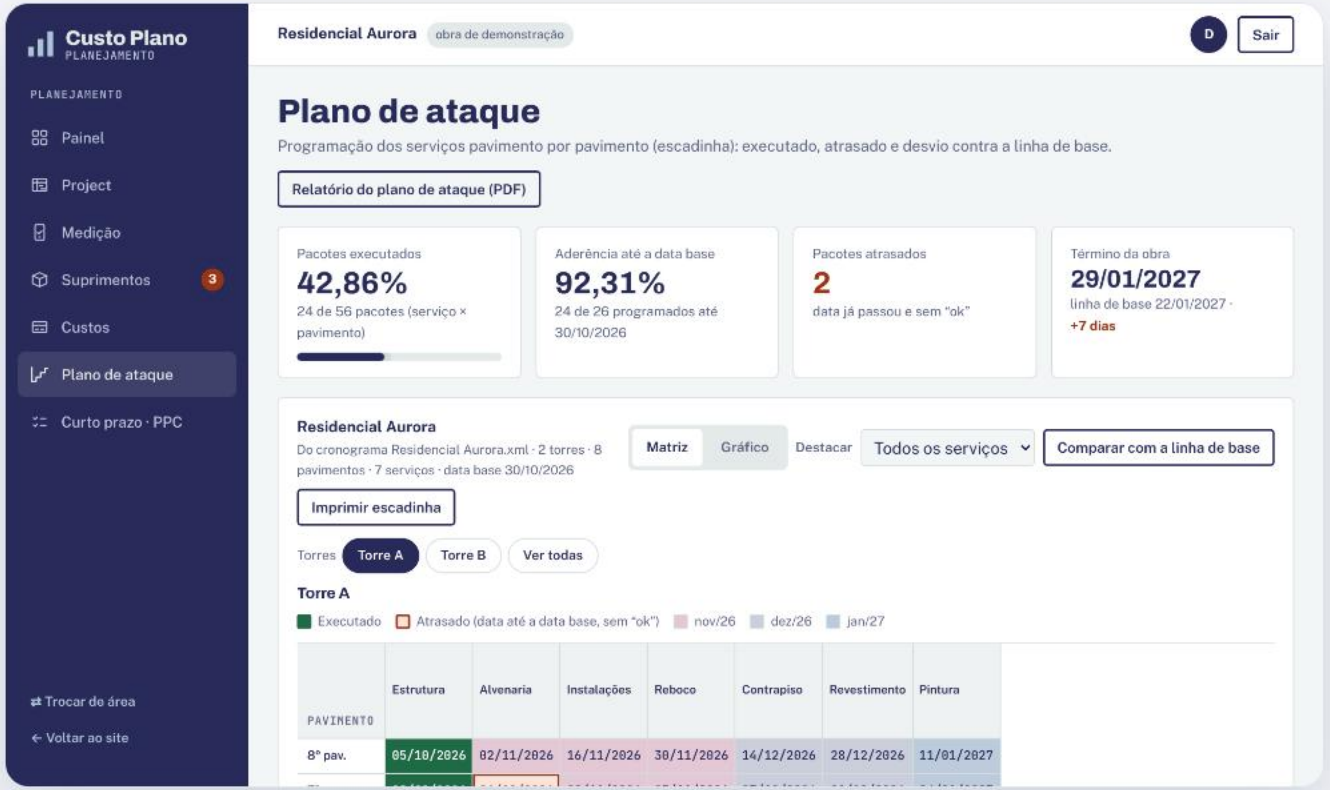

Tela do sistema · obra fictícia Residencial Aurora

INDICADORES

Os números que **acompanhamos**

PRAZO

PPC

Se o planejamento da semana é confiável.

pacotes concluídos ÷ planejados

PRAZO

IDP

Se a obra está no prazo.

avanço real ÷ avanço previsto

CUSTO

IC

Se a obra vai fechar no orçamento.

estimativa no término ÷ orçamento atualizado

QUALIDADE

IRNC

Quanto está sendo reprovado, por serviço e equipe.

itens reprovados ÷ verificados

Poucos indicadores, calculados sempre do mesmo jeito, para comparar semanas, obras e equipes.

QUALIDADE

Qualidade **conferida no canteiro**

Procedimentos e fichas de verificação para cada serviço, acompanhando a obra até cada não conformidade ser fechada.

Para quem vai implantar o PBQP-H (SiAC) ou a ISO 9001, e para quem já tem a certificação e quer mantê-la sem travar a produção.

No sistema, a ficha é preenchida no celular, com foto. O item reprovado só é liberado pela engenharia da obra depois de nova verificação.

FVS · ALVENARIA DE VEDAÇÃO · 6º PAVIMENTO (EXEMPLO)

ITEM	TOLERÂNCIA	RESULTADO
Prumo da parede	± 3 mm / 2 m	Aprovado
Nível da fiada de marcação	± 3 mm	Aprovado
Espessura da junta horizontal	10 mm ± 3 mm	Reprovado
Amarração nos pilares (tela)	a cada 2 fiadas	Aprovado
Encunhamento	após 7 dias	Aprovado

Junta fora da tolerância: não conformidade aberta para o encarregado com prazo de 5 dias.

DIFERENCIAIS

Por que a **Custo Plano**

Seu cronograma continua sendo a referência

Não pedimos para refazer o cronograma em outro sistema. Importamos o arquivo e devolvemos atualizado.

O plano de ataque vem da sua planilha

A escadinha que a obra já usa entra direto, sem redigitar.

Prazo, custo e qualidade no mesmo lugar

Não precisa de um sistema para planejar, outro para custo e outro para as FVS.

Tem gente nossa na obra

O sistema vem junto com a consultoria. Ninguém recebe uma senha e fica sozinho para aprender.

PRÓXIMO PASSO

Como começar

1 **Conversa de 30 minutos**
Você conta em que fase está a obra e o que mais preocupa: prazo, custo ou qualidade.

2 **Diagnóstico da obra**
Visitamos o canteiro e lemos cronograma, orçamento e contratos.

3 **Proposta fechada por obra**
Valor por obra, com o sistema incluído. Garantia de 60 dias: se o controle semanal não estiver rodando, devolvemos a implantação, nas condições do contrato.

FALE COM A GENTE

Bismark Rios
Custo Plano Consultoria
WhatsApp (11) 98823-6792
contato@custoplano.com.br
custoplano.com.br

ATENDEMOS

Em todo o Brasil. A reunião semanal e o sistema são online, e as visitas ao canteiro são combinadas na proposta de cada obra.
