
Custo Plano
CONSULTORIA

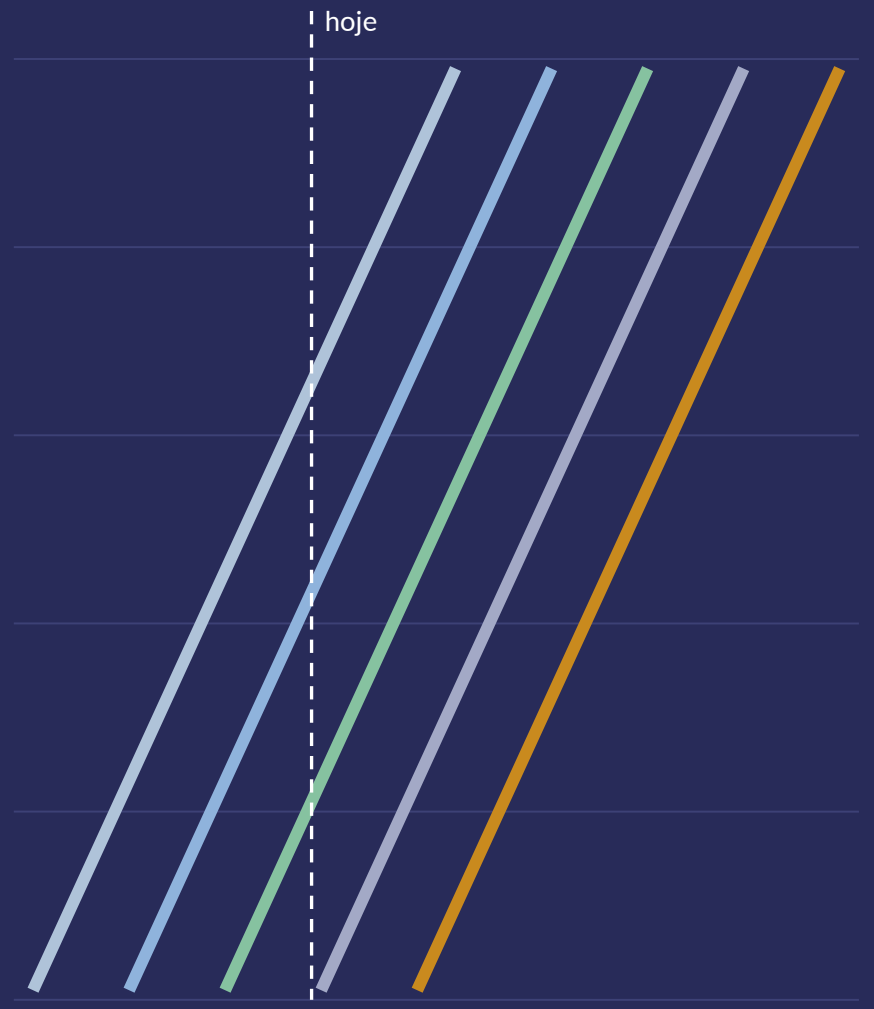

Planejamento, controle e qualidade de obras

Sua obra no prazo, no custo e com qualidade, controlada toda semana a partir do seu cronograma.

Apresentação institucional · 2026

Por que as obras saem do planejado

Toda obra começa com um orçamento e um cronograma. Quase toda obra termina diferente deles. A distância não vem de azar:



Plano que ninguém consulta

O cronograma é feito para aprovar a obra e fica na gaveta. O canteiro decide o dia a dia sem ele.



Medição que chega tarde

O avanço é medido no fim do mês, quando já não dá tempo de corrigir o atraso nem o custo.



Retrabalho sem controle

Serviço liberado sem verificação volta para ser refeito, consome prazo e margem.

O que a Custo Plano faz



Planejamento

Antes da obra ou quando ela saiu do trilho

- Estudo de prazo e estratégia de ataque
- Cronograma no MS Project com linha de base
- Linha de balanço por pavimento
- Histograma de mão de obra e suprimentos
- Orçamento meta e curva de desembolso



Controle semanal

Uma reunião curta toda semana, com números

- Curto prazo e PPC
- Levantamento e remoção de restrições
- Medição física e curva S
- Custo previsto × realizado
- Relatório mensal para a diretoria



Qualidade

PBQP-H e ISO 9001 que o canteiro consegue cumprir

- Procedimentos e fichas FVS/FVM
- Inspeções e não conformidades
- Preparação para auditoria
- Treinamento de mestres e encarregados

Como implantamos na sua obra

1

Diagnóstico

Visita, leitura de projetos, orçamento e contratos. O que já funciona e o que trava a produção.

Entrega: Relatório de diagnóstico

2

Plano de longo prazo

Organização do cronograma da sua engenharia: etapas, sequência e ritmo por pavimento definidos por ela.

Entrega: Cronograma e linha de balanço

3

Implantação no canteiro

Reuniões semanais com engenheiro e encarregados, painel de restrições e apontamento.

Entrega: Rotina semanal e PPC

4

Controle contínuo


Prazo, custo e qualidade acompanhados, com replanejamento quando a obra desvia.

Entrega: Relatório gerencial mensal

Uma semana de obra com a Custo Plano

Segunda	Reunião de curto prazo com engenheiro e encarregados. Fecha o PPC da semana anterior, anota por que cada pacote não saiu e define os desta semana.
Terça a quinta	Restrições: material, projeto, equipe, frente liberada. Cada uma com responsável e data.
Sexta	Medição pelo celular, pavimento por pavimento, e FVS nos serviços que terminaram. O que reprovar vira não conformidade com prazo.
Fim do mês	Relatório para a diretoria: avanço contra a linha de base, IDP, IC e não conformidades em aberto.

Sistema próprio, incluído na consultoria

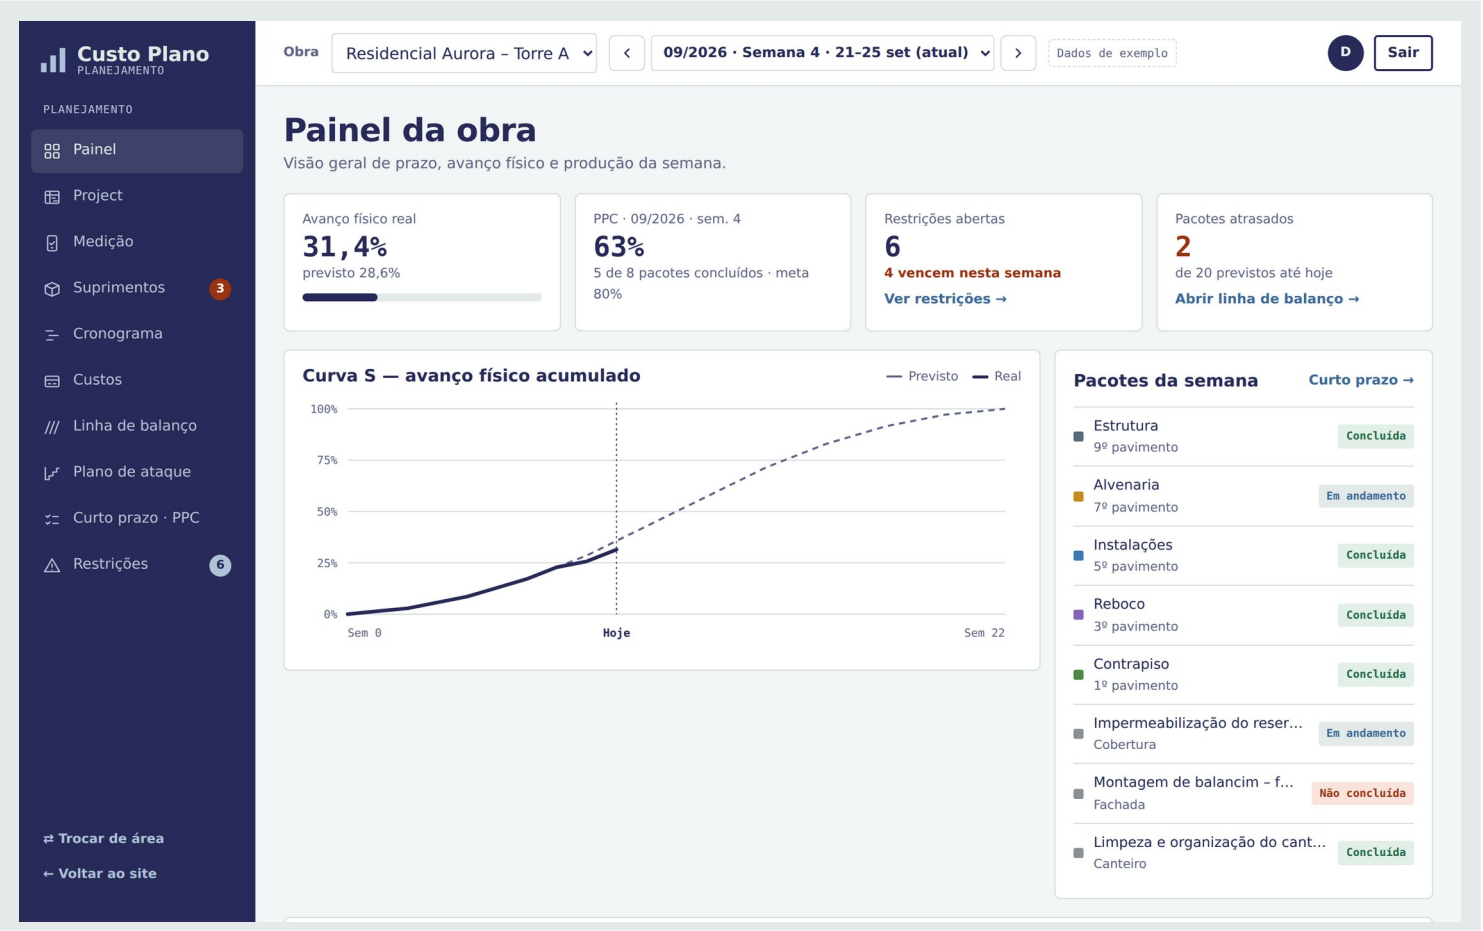

Ligado ao MS Project

Lê o .mpp da obra e devolve o arquivo atualizado.

Medição no celular

Funciona sem internet e envia quando o sinal volta.


Custo: orçado × realizado

Orçado × realizado do ERP, mês a mês, e estimativa no término (IC).

Qualidade no canteiro

FVS com foto e não conformidades com prazo.

Do MS Project ao canteiro, e de volta

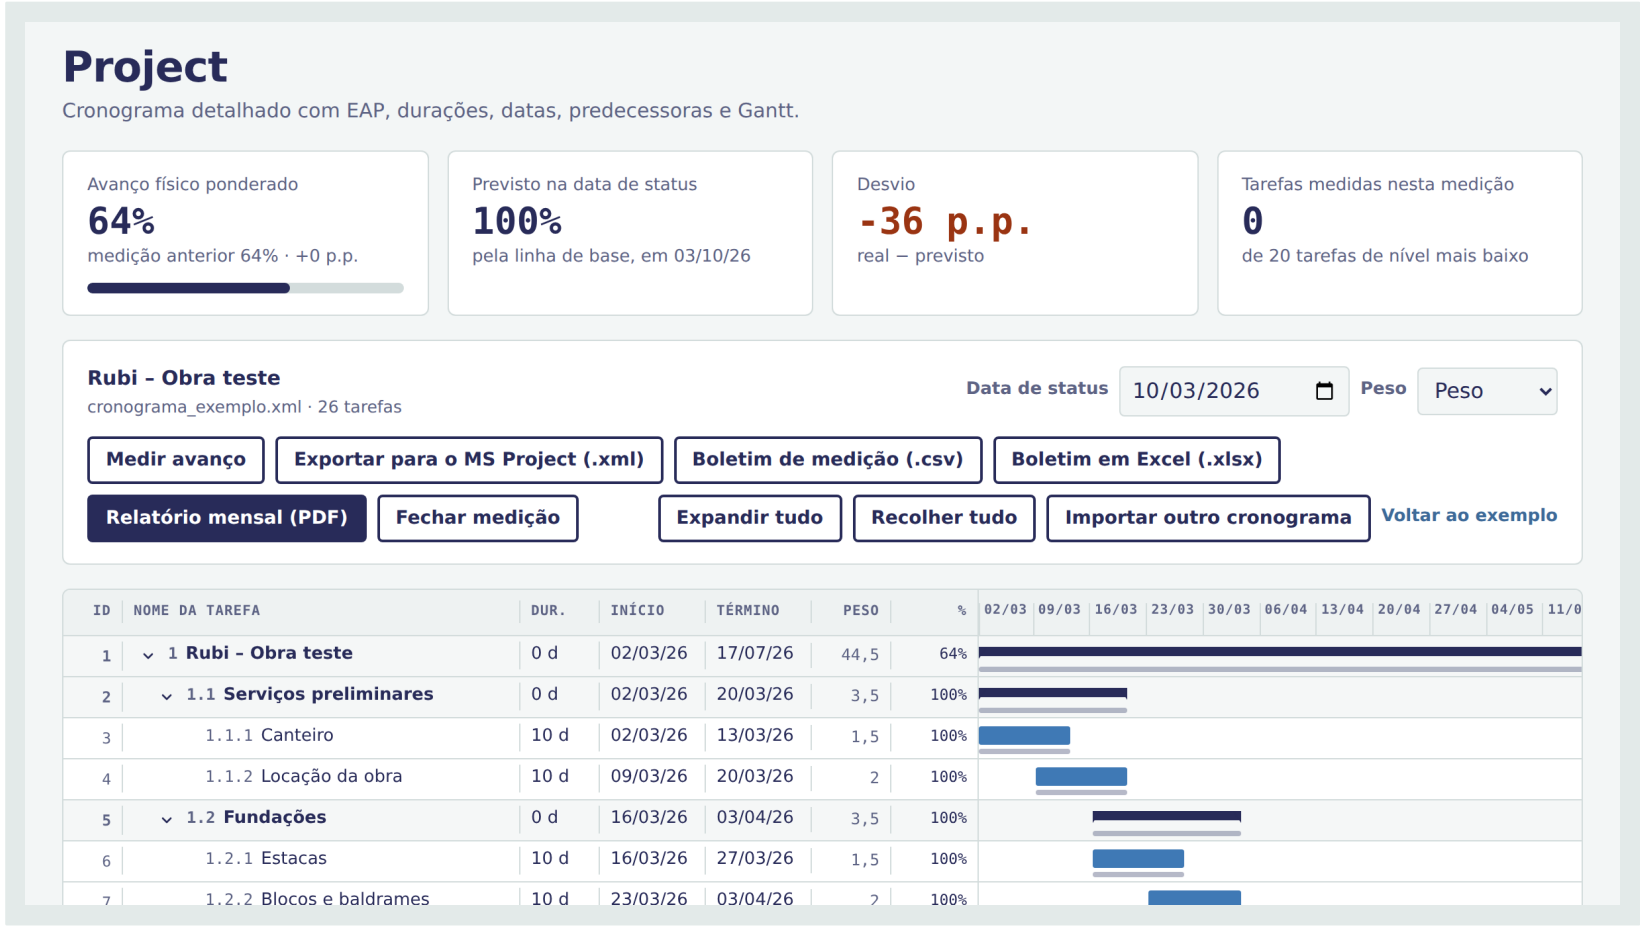



1. Importa o .mpp com EAP, datas, linha de base e pesos ao Project e gera o relatório

2. Mede no celular, tarefa por tarefa

3. Devolve o .xml ao Project e gera o relatório

Plano de ataque e linha de balanço

PAVIMENTO	Estrutura	Alvenaria	Instalações	Reboco	Contrapiso	Revestimento	Pintura
CICLO (DIAS)	5	5	5	5	5	5	5
10º pav.	28/09/26	19/10/26	02/11/26	09/11/26	23/11/26	07/12/26	21/12/26
9º pav.	21/09/26	12/10/26	26/10/26	02/11/26	16/11/26	30/11/26	14/12/26
8º pav.	14/09/26	05/10/26	19/10/26	26/10/26	09/11/26	23/11/26	07/12/26
7º pav.	07/09/26	28/09/26	12/10/26	19/10/26	02/11/26	16/11/26	30/11/26
6º pav.	31/08/26	21/09/26	05/10/26	12/10/26	26/10/26	09/11/26	23/11/26
5º pav.	24/08/26	07/09/26	28/09/26	05/10/26	19/10/26	02/11/26	16/11/26
4º pav.	17/08/26	31/08/26	21/09/26	28/09/26	12/10/26	26/10/26	09/11/26
3º pav.	10/08/26	24/08/26	07/09/26	21/09/26	05/10/26	19/10/26	02/11/26
2º pav.	03/08/26	17/08/26	31/08/26	14/09/26	28/09/26	12/10/26	26/10/26
1º pav.	27/07/26	10/08/26	24/08/26	07/09/26	21/09/26	05/10/26	19/10/26

A escadinha que a obra já usa no Excel entra direto, sem redigitar.

Cada célula é a data de um serviço num pavimento: verde executado, vermelho atrasado, cor do mês para o programado.

A comparação com a linha de base mostra quantos dias cada pacote ganhou ou perdeu.

Os números que acompanhamos

PPC

Se o planejamento da semana é confiável

pacotes concluídos ÷ planejados

IDP

Se a obra está no prazo

avanço real ÷ avanço previsto

IC

Se a obra vai fechar no orçamento

estimativa no término ÷ orçamento atualizado

IRNC

Quanto está sendo reprovado, por serviço e equipe

itens reprovados ÷ inspecionados

Poucos indicadores, calculados sempre do mesmo jeito, para comparar semanas, obras e equipes.

Qualidade conferida no canteiro

Procedimentos e fichas de verificação para cada serviço, acompanhando a obra até cada não conformidade ser fechada.

Para quem vai implantar o PBQP-H (SiAC) ou a ISO 9001, e para quem já tem a certificação e quer mantê-la sem travar a produção.

No sistema, a ficha é preenchida no celular, com foto. O item reprovado só é liberado depois de nova inspeção.

FVS · Alvenaria de vedação · 6º pavimento (exemplo)

Item verificado	Tolerância	Resultado
Prumo da parede	± 3 mm / 2 m	**Aprovado**
Nível da fiada de marcação	± 3 mm	**Aprovado**
Espessura da junta horizontal	10 mm ± 3 mm	**Reprovado**
Amarração nos pilares (tela)	A cada 2 fiadas	**Aprovado**
Encunhamento	Após 7 dias	**Aprovado**

Junta fora da tolerância: não conformidade aberta para o encarregado, com prazo de 5 dias.

Por que a Custo Plano

O MS Project continua sendo a referência

Não pedimos para refazer o cronograma em outro sistema. Importamos o .mpp e devolvemos atualizado.

O plano de ataque vem da sua planilha

A escadinha que a obra já usa entra direto, sem redigitar.

Prazo, custo e qualidade no mesmo lugar

Sem um sistema para planejar, outro para custo e outro para as FVS.

Tem gente nossa na obra

O sistema vem junto com a consultoria. Ninguém recebe uma senha e fica sozinho para aprender.

Como começar

1

Conversa de 30 minutos

Você conta em que fase está a obra e o que mais preocupa: prazo, custo ou qualidade.

2

Diagnóstico da obra

Visitamos o canteiro e lemos cronograma, orçamento e contratos.

3

Proposta fechada por obra

Valor por obra, com o sistema incluído. Garantia de 60 dias: se o controle semanal não estiver rodando, devolvemos a implantação, nas condições do contrato.

Fale com a gente

Bismark Santos Rios
Custo Plano Consultoria

WhatsApp: (11) 98823-6792
E-mail: contato@custoplano.com.br
custoplano.com.br

Atendemos Guarulhos, São Paulo, São José dos Campos, Atibaia e Bragança Paulista.
